


Ms-Project





Agenda

- Proyecto
- Calendario
- Diagrama de Gantt
- Ruta Critica
- Estadística de Proyecto






Creación del Proyecto

1

Ir al menú Vista y desactivar la opción de escala de tiempo, como se muestra a continuacion:





Ir a la parte inferior y en Nuevas tareas activar la opción Programada automáticamente, como se muestra a continuacion:





Debemos ir al menú Proyecto y cambiar el tiempo de trabajo, como se muestra a continuación:



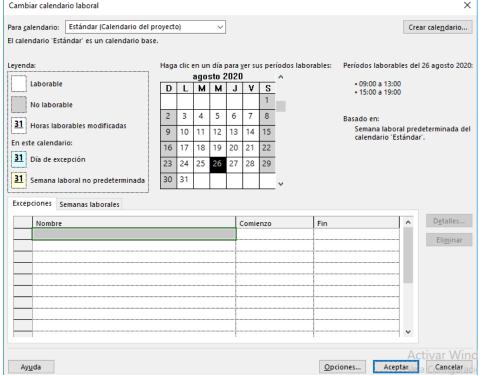

4


Estableceremos un calendario como se muestra en la ventana.




5 Encontraremos un botón Crea


Crear calendario...

Creamos un calendario con el nombre de ProyectoSoft, y hacemos una copia del estándar




Luego iremos al botón de opciones, como se muestra a Continuacion:



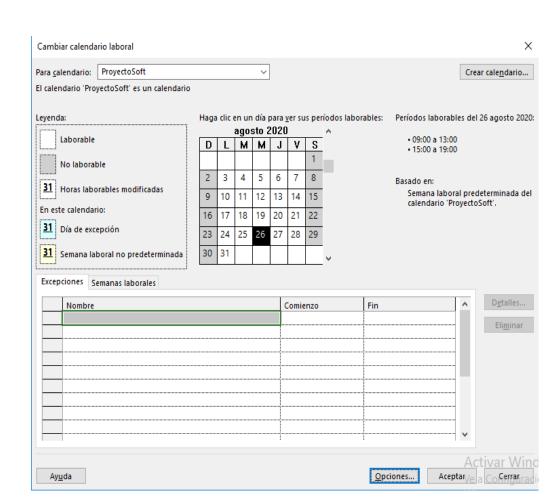









Agregaremos los siguiente parámetros de labores, como se muestra a continuación:

Opciones de calendario	para es <u>t</u> e proy	ecto: Proyecto1
<u>L</u> a semana comienza en	: Lunes	<u> </u>
El año <u>f</u> iscal comienza e	n: Enero	\vee
Usar el a <u>ñ</u>	o inicial para la	numeración de los años fiscales
<u>H</u> ora de comienzo predeterminada: Hora de fin	08:00 🗸	Se asignan estos horarios a las tareas cuando se escribe una fecha de comienzo o fin sin especificar una hora. Si cambia esta configuración, es conveniente hacerla
predeterminada:	19:00	coincidir con el calendario del proyecto mediante el
Horas por <u>d</u> ía:	10 🖨	comando Cambiar tiempo de trabajo de la ficha Proyecto en la cinta.
Horas por <u>s</u> emana:	50	
Dí <u>a</u> s por mes:	20	

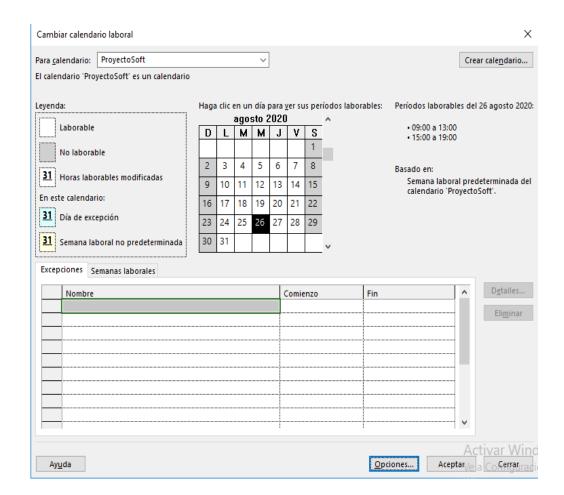




9 Debemos ir a la sección de Semana Laborales:




10 Activar la opción del botón Detalles :

Semanas laborales				
re	Comienzo	Fin	^	D <u>e</u> talles

Se debe seleccionar la frecuencia laboral:



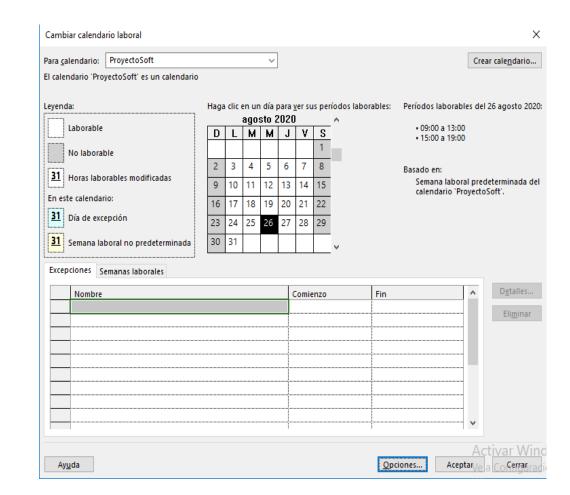

Agregar Calendario

Información

del proyecto



12


Se debe agregar excepciones de fechas festivas:


ксер	ciones Semanas laborales			
	Nombre	Comienzo	Fin	
1	Combate de Angamos	8/10/2020	8/10/2020	
2	Todos los santos	1/11/2020	1/11/2020	
3	Navidad	25/12/2020	25/12/2020	
4	Año Nuevo	1/01/2021	1/01/2021	


13

Debemos ir al menú Proyecto, a la opción Información del Proyecto, se mostrara la siguiente ventana:

Agregar los parámetros que se muestran a continuación :



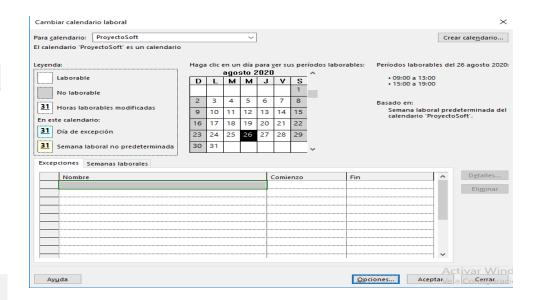




15

Agregar Calendario





14

Agregamos calendario a las actividades, como se muestra a continuacion:



Se mostrara la siguiente ventana y agregamos los parámetros:

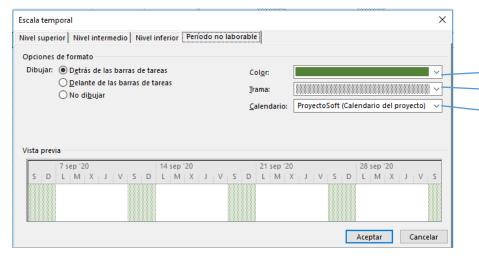

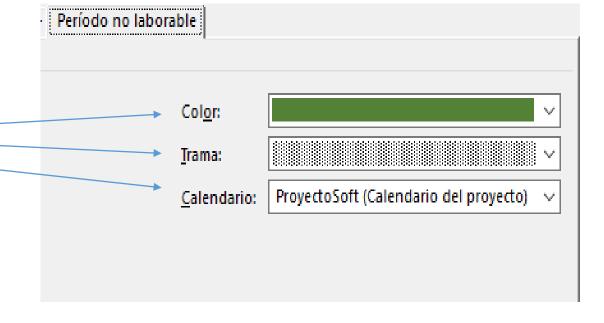

Agregar Tareas



- =

Debemos agregar una lista de Fases y disciplinas, como se muestra a continuacion:

		Modo .			
	0	de 🔻	Nombre de tarea	Duración 🔻	Comienzo 🕶
1		-5	Proyecto Informatico	1 día?	lun 14/09/20
2		-5	Fase 1: Inicio	1 día?	lun 14/09/20
3		- 5	Modelamiento del Negocio	1 día?	lun 14/09/20
4		-3	Requerimiento	1 día?	lun 14/09/20
5		-3	Fase 2: Elaboracion	1 día?	lun 14/09/20
6		-3	Analisis de Sistema	1 día?	lun 14/09/20
7			Diseño de Sistema	1 día?	lun 14/09/20
8		- 5	Fase 3: Construccion	1 día?	lun 14/09/20
9		- 5	Implementacion	1 día?	lun 14/09/20
10		5	Pruebas	1 día?	lun 14/09/20
11		-5 ₃	Fase 4: Transicion	1 día?	lun 14/09/20
12		- 5	Configuracion y Manejo del cambio	1 día?	lun 14/09/20

Luego procedemos a jerarquizar(aplicar sangría derecha), como se visualiza:

	0	Modo de ↓	Nombre de tarea ▼	Duración ▼
1		-	■ Proyecto Informatico	1 día?
2		-5	Fase 1: Inicio	1 día?
3		-	Modelamiento del Negocio	1 día?
4		-5	Requerimiento	1 día?
5		-5	1 día?	
6		-5	Analisis de Sistem	1 día?
7		-5	Diseño de Sistema	1 día?
8		-5	Fase 3: Construccio	1 día?
9		-3	Implementacion	1 día?
10		-5	Pruebas	1 día?
11		-5	Fase 4: Transicion	1 día?
12		->	Configuracion y Manejo del	1 día?

Seleccionamos desde la fila 2 hasta las 12, y aplicamos sangría a la derecha.

Agregar Tareas



18

De la misma forma debemos crear las sangrías en las disciplinas, como se visualiza:



Colocar los tiempos o duración establecidos en las disciplinas, como se visualiza:



	0	Modo de →	Nombre de tarea →	Duración →
1			■ Proyecto Informatico	30 días?
2		*		5 días
3		-3	Modelamiento del Negocio	1 día
4		-5	Requerimiento	3 días
5		*		10 días
6		-5	Analisis de Siste	3 días
7		-5	Diseño de Siste	6 días
8		*		30 días
9		-5	Implementacio	25 días
10		-5	Pruebas	5 días
11		*		5 días
12		- 5	Configuracion	2 días
13		<u>-5</u>	Manejo del cambio	2 días

Vincular Tareas



20

Ahora procedemos a vincular la tarea de la fila 3 con la tarea de la fila 4, como se visualiza:

2	*	■ Fase 1: Inicio	5 días	lun 14/09/20		
3		Modelamiento del Negocio	1 día	lun 14/09/20		
4		Requerimiento	3 días	lun 14/09/20		
5		4 F 2:	40 45	l		


21

Seleccionamos las 2 tareas y vinculamos usando el botón:



22

La otra forma, es realizar el enlace con la cadenita, cuando eliges una de las barras, haces clic, la arrastras a la otra barra, verificar la figura a continuacion:




Vincular Tareas



octubre 2020

Proceda a realizar las vinculaciones como se muestra en el **Proyecto completo:**

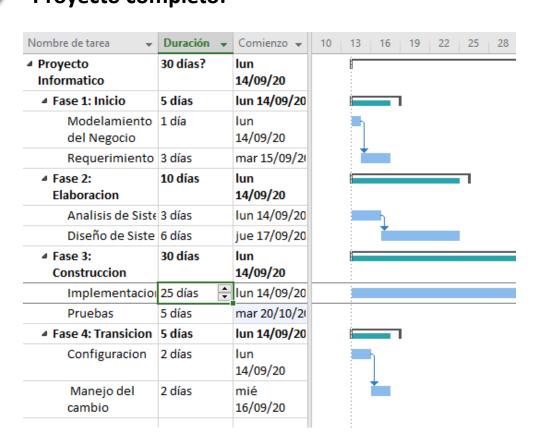

Para visualizar el diagrama completo, debe ir al cuadro de fechas semanales, clic derecho y activar zoom:


Escala temporal...

Cambiar tiempo de trabajo...

Mostrar u ocultar estilos de barra >

Activar la opción Proyecto completo y activar el botón aceptar, como se muestra en la figura:

Zoom...




Vincular Tareas




26

Activar la opción Proyecto completo y activar el botón aceptar.

Vincular las tareas, como se muestra a continuación:

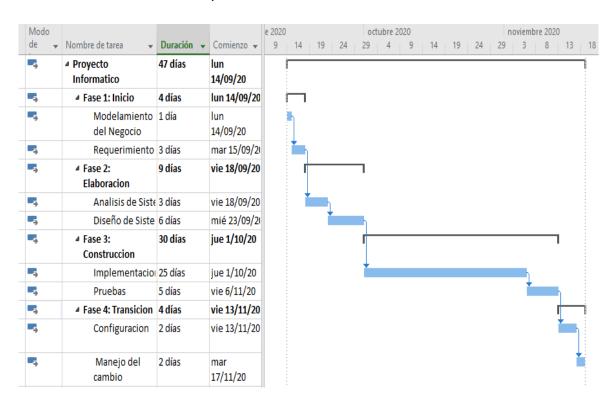

No olvidar que la tarea se programa de forma automática







Ruta Critica



Ahora procedemos a visualizar la tarea critica, ir al menú Formato Cheking en [x]Tarea criticas



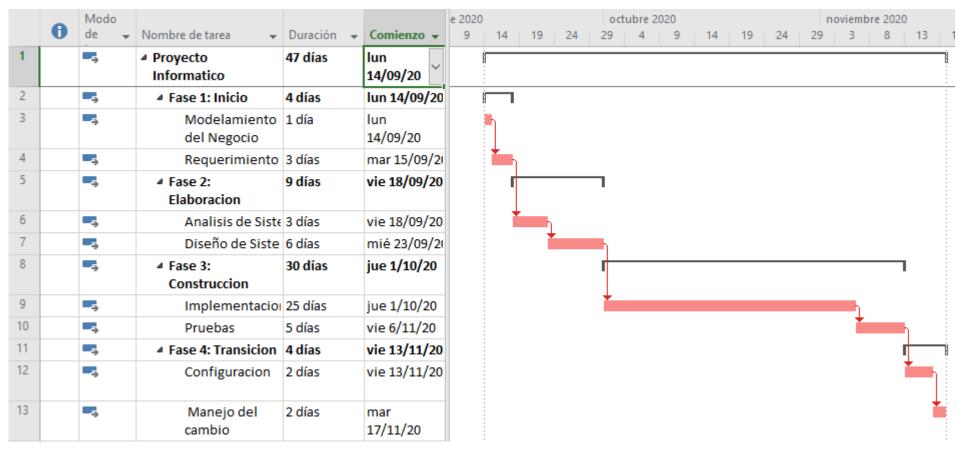

Agregar Hitos



29

Agregar una tarea Hito, ir al menú Tarea y activar el botón Hito

1	-5		47 días	lun 14/09/20	
2	-5	<hito nuevo=""></hito>	0 días	lun 14/09/20	14/09
3	- 5		4 días	lun 14/09/20	



Crear un hito al inicio y fin del proyecto como se muestra a 30 continuacion:


> Los hitos siempre tiene una Duración de 0 días.

□ Proyecto Informatico		47 días	lun 14/	09/20	Ú .	
	Inicio # Fase 1: Inicio		0 días lun 14/09/20		14/09/20	14/09
			4 días	lun 14/09/20		į
			1	'		:
	-5		Manejo d ambio	el	2 días	mar 17/11/20
	-5	Fin			0 días	lun 14/09/2

Diagrama de Gantt



Resaltar las fases del proyecto como se muestra a continuacion:

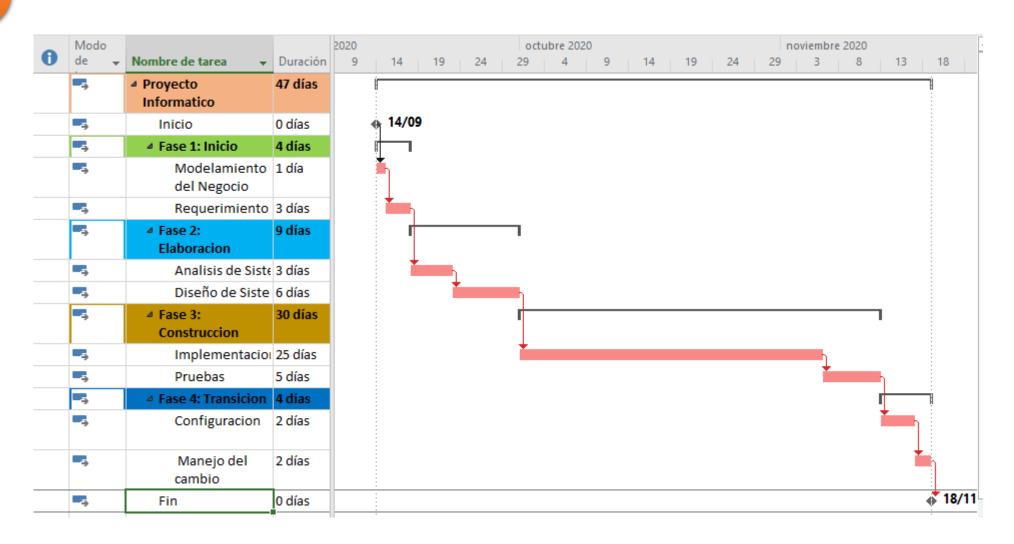



Estadísticas del Proyecto



32

Ir el menú Proyecto y activar la opción de Información del Proyecto

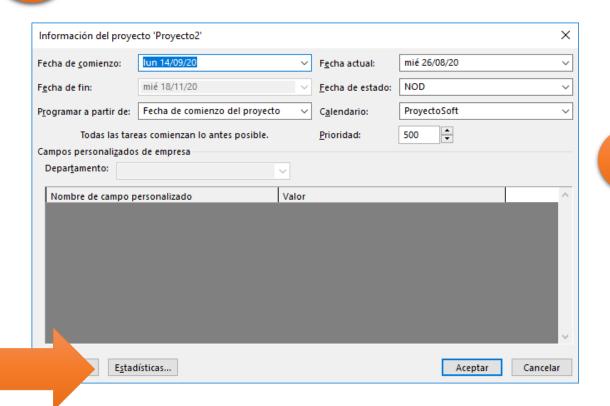



Activar el botón Estadística y se mostrara la siguiente ventana:

